Grafiku i punimeve për ndërtesën "Pallati Nr. 37, 39, Lagja nr. 13, pranë pistës Iliria, Bashkia Durrës"

Emërtimi i punimeve	Nj	Sasi	Norma e kohës / njësi	Orë pune	Ditë pune	Njerëz	Afati
Çmontim dyer dritare	m²	424	1.32	559.68	70	10	7
Montim dyer dritare	m²	424	2.2	932.8	117	10	12
Çmontim i pajisjeve hidrosanitare	copë	160	2.5	400	50	10	5
Montim i pajisjeve hidrosanitare	copë	160	3	480	60	10	6
Prishje shtresash dyshemeje+plintuese	m²	1000	0.93	930	117	10	12
Prishje mur tulle me pastrim	m³	300	6.2	1860	233	15	16
Prishje struktura prej betoni	m³	18	15.42	277.56	35	2	18
Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m²	725	0.61	442.25	56	8	7
Prishje suva brenda+pastrim ~ 4m	m²	5082	1	5082	636	15	43
Prishje suvaje e zakonshme + pastrim fugash fasade mbi 8m	m²	1550	1.5	2325	291	12	25
Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompë, llaç perzier M 25	m²	5082	0.775	3938.55	493	20	25
Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m²	1550	2.5	3875	485	18	27
Mur tulle me 8 vrima, t=20cm, h~3m, llaç i përzier M15	m³	300	2.9	870	109	10	11
F.V. Veshje me rrjetë të galvanizuar e mureve të tullës (Ø1 me hap 5mm në çdo drejtim)	m²	250	1.5	375	47	5	10
Shtrese betoni C 12/15	m³	70	8.6	602	76	10	8
Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m²	700	0.65	455	57	8	8
Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m²	700	2.46	1722	216	10	22
Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m²	1550	0.36	558	70	8	9
Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	553	5	2763.2	346	10	35
Shpime vrimash në beton për ankorimin e shufrave + rezinë ankoruese	copë	3000	0.2	600	75	5	15
Prishje e shtresës mbrojtëse me kujdes për mosdëmtimin e elementit deri në nxjerrjen e shufrave të armaturës	m²	1650	4	6600	825	20	42
Pastrim i sipërfaqes së betonit me kompresor ajri, ose me pompë vakumi, për heqjen e papastërtive dhe të rërës kuarcore	m²	1650	0.15	247.5	31	2	16
Këmishimi i kolonave me beton C 30/37	m³	310	87	26970	3372	40	85
Këmishimi i trarëve me beton C 30/37	m³	92	60	5520	690	15	46
F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	17	45	765	96	5	20
F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	17	60	1020	128	5	26
F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	75	42	3150	394	8	50
F.v. Percjelles FS17 S=1*1mm veteshuares	ml	600	0.01	6	1	2	1
F.v. Percjelles FS17 S=1*5mm veteshuares	ml	600	0.01	6	1	2	1
F.v. Percjelles FS17 S=2*5mm veteshuares	ml	600	0.01	6	1	2	1
F.v. Percjelles FS17 S=4mm veteshuares	ml	600	0.01	6	1	2	1
F.V.Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 3G6mm²	ml	90	0.1	9	2	2	1
F.V.Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 1G70mm²	ml	90	0.2	18	3	2	2
F.V.Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 1G95mm²	ml	270	0.2	54	7	2	4
F.V.Kabell FG16OR16 0,6/1KV, 1G120mm²	ml	80	0.2	14	2	2	1

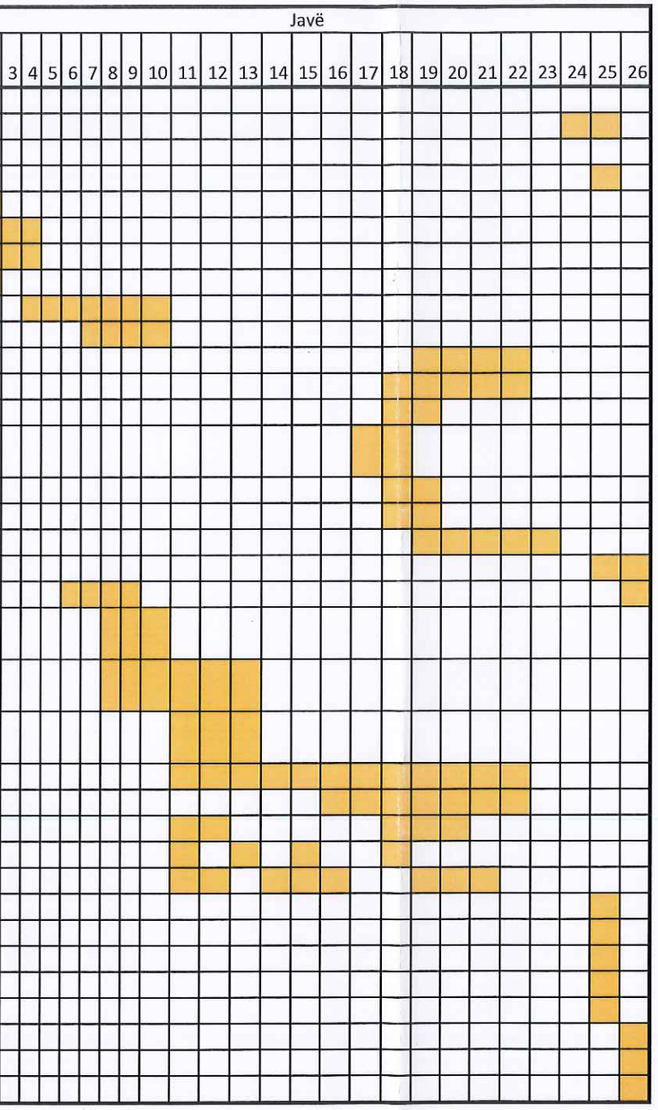

STRUKTURA URBANE DHE TRANSPORTI
