GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: REHABILITIMI I SHETITORES TAULANTIA LOTI 3
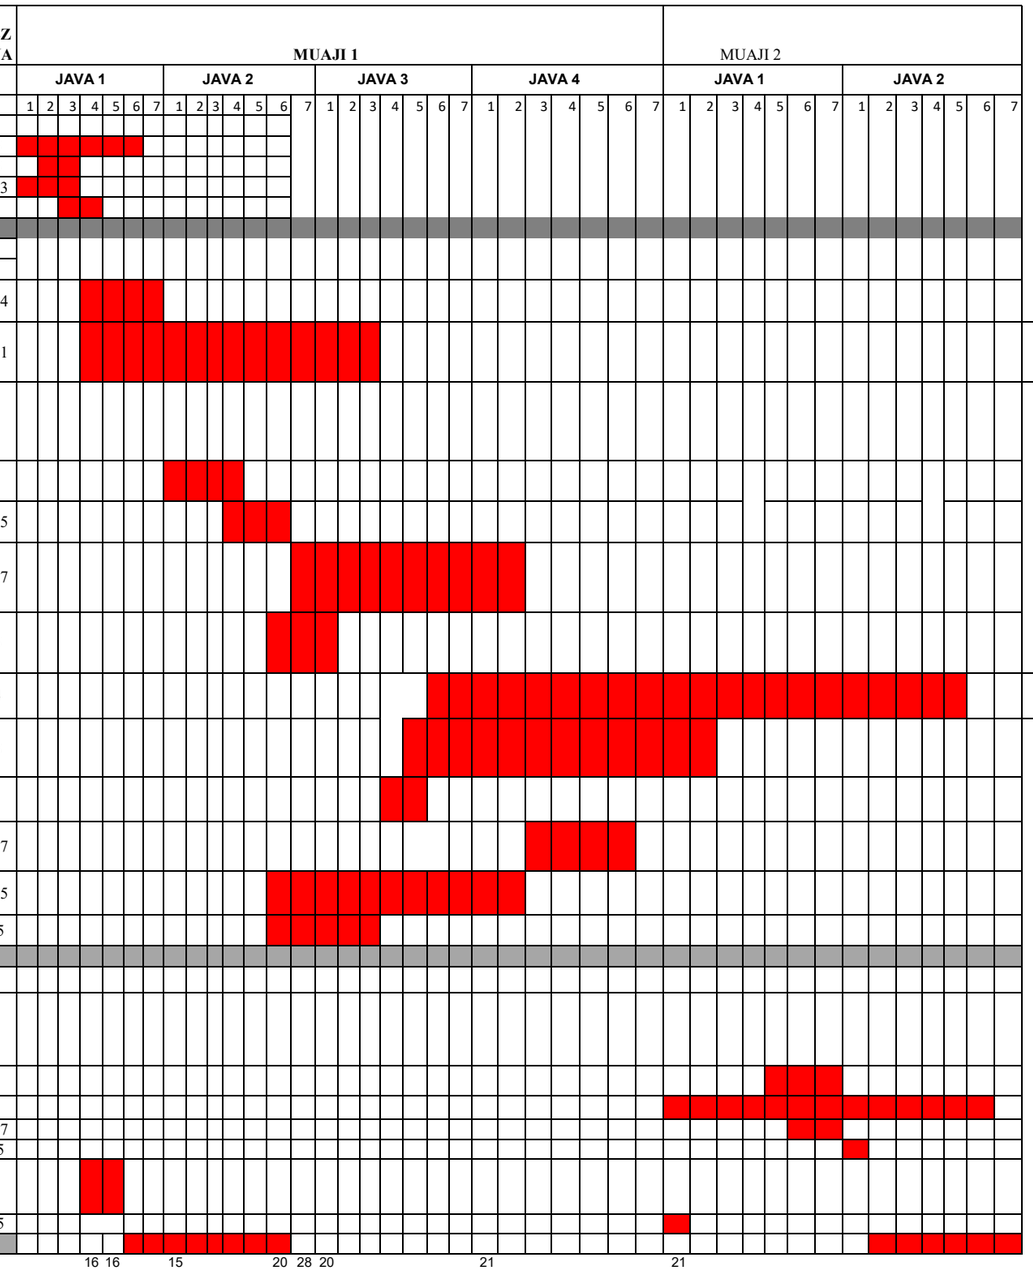
Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ORE PUNE		DITE PUNE	NR. PUNET OREVE	KOHEZ GJATJA
					op/nj	sasi		np	dp
		PUNIME PRISHJEJE							
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	20	18.8	376	47	4	11.75
2	3.25/b	Prishje trotuareve + germim	m3	20	4.9	98	12.25	2	6.125
3	3.3	Heqje peme ekzistuese	cope	200	0	80	10	3	3.33333
4	An	Heqje bordure betoni	ml	80	0.90	72	9	5	1.8
		Punime ndertimi							
1	An 164/1b	Mbushje me cakull e gur gurore dhe ngjeshur me makineri	m³	317	0.34	107.816	13.47701	3	4.49234
2	An	Mbushje me gure 1.5÷2.5. ton sipas projektit platforma me gure qe sherbejne per zgjerimin e shetitores.	m³	1130	0.8	904.136	113.017	8	14.1271
3	3.89/b+3.1 58/5a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ne zonen e shtrimit me kubik guri deri tek muri rrethues ekzistues +transport deri 5km	m^3	58.0	MAKINERI				
4	3.211	Shtrese çakulli trashësi minimale mbas ngjeshjes 20 cm perhapur e ngjeshur me makineri	m²	580	0.28	162.4	20.3	5	4.06
5	3.212/b	Shtrese stabilizant, trashësi minimale mbas ngjeshjes 10 cm	m²	580	0.0750	43.5	5.4375	2	2.71875
6	2.262/4	Shtresë betoni C16/20 e armuar me zgare hekuri Ø 6 (20x20), trashësia e betonit 10 - 15 cm nen shtresen e zones se shtruar me kubik guri	m³	58.0	8.6	498.8	62.35	6	10.3917
7	2.166	F.V hekur ne shtresat me beton nen shtresen e zones se shtruar me kubik guri (zgare 20x20) Ø6	ton	1.35	60	81	10.125	3	3.375
8	An	F.v shtrim me kubik gur gri/bardhe te vendit permasa 15x15 cm trashesi 8-10 cm, fuge max 1 cm	m²	560	3.12	1747.2	218.4	10	21.84
9	An	F.v bordure prej guri i bardhe me qoshe te latuar, permasa 15x25 dhe 15x35 cm	ml	160	3.12	499.2	62.4	5	12.48
10	2.262/3	Shtresë betoni C12/15 per nivelim bordure	m³	4.0	8.6	34.4	4.3	2	2.15
11	An	Beton C 20/25 i trajtuar me aditiv kunder kriprave te ujit te detit per traun 50x30 te themelit	m^3	25	3.46	86.5	10.8125	3	3.60417
12	An	Beton C 20/25 i trajtuar me aditiv kunder kriprave te ujit te detit per themelin	m^3	150	3.46	519	64.875	6	10.8125
13	2.167	FV. Hekur per traun e themelit	ton	4.65	42	195.3	24.4125	5	4.8825
		Punime gjelberimi dhe vaditje							
1	3.89/b+3.1 58/5a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet ne zonen e gjelberimit deri ne 30cm +transport deri 5km	m3	150.0					
2	An	Mbushje me dhe vegjetal	m³	320.0	0.17	54.4	6.8	2	3.4
3	3.643	Mbjellje me bari	m²	3200	0.17	544	68	5	13.6
4	An	F.v peme LIGUSTRUM JAPONICUM diametri. 14/16 cm (ligustro)	cope	55	1	55	6.875	3	2.29167
5	An	F.v kosha mbeturinash	cope	5	0.5	2.5	0.3125	1	0.3125
6	4.3	Konstruksione metalike dekorative per kangjellat e pemeve tek rruga hotel Arvi	ton	0.4	34	13.6	1.7	1	1.7
7	An	F.V pomp vaditje 18.5 kw	cope	1	8.38	8.38	1.0475	1	1.0475
		PUNIME ELEKTRIKE	op	224			28	2	14
