GRAFIKU I PUNIMEVE

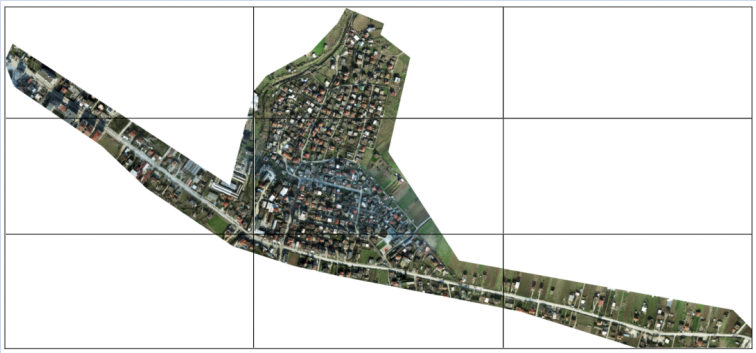

OBJEKTI:

"NDERTIMI I RRJETIT TE RI TE KANALIZIMEVE TE UJRAVE TE ZEZA TE LAGJES UZNOV, RAJONI NR.3, BASHKIA BERAT"

POROSITES:
BASHKIA BERAT

PROJEKTUES:
B.O.E: "KKG Project" sh.p.k. & "GR Albania" sh.p.k. & "NET- GROUP" sh.p.k

2021

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: " NDERTIMI I RRJETIT KUZ NE LAGJEN UZNOVE, RAJONI NR.3, BASHKIA BERAT "

NR.	EMERTIMI I PUNIMEVE	AFATI KOHOR I NDERTIMIT NE MUAJ (Muaji 1 – Muaji 12; I, II, III, IV)
I - PUNIME PRISHJE		
1	Prerje bime te vogla ø-10cm	
2	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	
3	Prerje shtrese asfalti ekzistues me makineri	
4	Skarifikim shtrese asfalti me makineri tmes=6cm	
5	Heqje pllaka trotuari	
6	Prerje shtrese betoni nen trotuar me makineri	
7	Prishje shtresa betoni	
8	Prishje struktura prej betoni (puseta ekzistuese)	
9	Prishje rrjetit ekzistues	
10	Transport me auto deri 5.0 km	
II - GERMIME DHE MBUSHJE KANALI PER TUBACIONET		
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	
2	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	
3	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	
4	Shtrese rere per tubacionet	
5	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri ne tokat vegjetale	
6	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	
7	Transport dheu me auto deri 5.0 km	
III- PUNIME PER RIPARIM TE SHTRESAVE TE RRUGES DHE TROTUAREVE		
1	Nenshtrese zhavorri t=20cm	
2	Shtrese betoni C 12/15(nen trotuar t=10cm)	
3	Vendosje pllaka trotuari	
4	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	
5	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	
6	Shtrese stabilizant t=10-15cm	
7	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm,me makineri	
8	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	
IV- TUBA TE BRINJEZUAR HDPE		
1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=200 mm per lidhjet terciare me shtepite	
2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d= 250 mm	
3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=315 mm	
4	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	
5	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	
6	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	
7	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm	
8	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike	
9	F.V. shirit sinjalizimi	
V- GERMIME DHE MBUSHJE PER PUSETAT		
1	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak.	

2	Nenshtrese zhavorri t=10cm (nen pusete)																																																
3	Shtrese betoni C 7/10 (nen pusete)																																																
4	Mbushje me zhavorr pas mureve pusetave																																																
5	Transport dheu me auto deri 5.0 km																																																
VI-PUSETAT																																																	
1	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize																																																
2	Ndertim Pusete kontrolli b/a, Φ1.0 m, h=1.5 ÷2.0 m + kapak gize																																																
3	Ndertim Pusete kontrolli b/a,Φ1 m, h=2.0÷2.5 m + kapak gize																																																
4	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize																																																
5	Furnizim - Vendosje puseta HDPE lartesi 1.0 - 1.5 m																																																
6	Furnizim - Vendosje puseta HDPE lartesi 1.5 - 2.0 m																																																
7	Furnizim - Vendosje puseta HDPE lartesi 2.0 - 2.5 m																																																
8	Furnizim - Vendosje puseta HDPE lartesi 2.5 - 3.0 m																																																
9	Furnizim - Vendosje puseta HDPE lartesi 3.0 - 3.5 m																																																
10	Ndertim Pusete kryesore betoni 2x2 m kapak gize H=2.5-3.5 m																																																

PROJEKTUES:

B.O.E: “KKG Project” sh.p.k. & “GR Albania” sh.p.k. & “NET- GROUP” sh.p.k

Perfaqesues

Ing. Ardit Kane

Ardit Kane

Digitally signed by Ardit Kane
Date: 2024.05.08 20:46:11 +02'00'
