GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: Rikonstruksioni i Galerisë së Artit Pamor "Nikolet Vasia", Durrës

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ore pune		dite pune	nr i punetoreve	kohezgjatja
					op/nj	sasi		np	dp
N°		Zeri Punes	Njesi	Sasia					
	A-	PUNIME NDERTIMORE							
	I-	PUNIME PRISHJE							
1	2.281	Heqje pllaka dyshemeje	m2	240.0	0.996	239.04	29.88	6	5.0
2	2.426/11	Prishje suvatim mur I brendshem	m2	323.5	0.93	300.855	37.606875	8	4.7
3	AN.1	Heqje e parapetit te xhamit mbi strehe	m2	20.0	1	20	2.5	2	1.3
4	2,293	Heqje tavan i varur me kartonxhes	m2	200.5	1.26	252.63	31.57875	8	3.9
	2	PUNIME SHTRESASH							
1	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	47.2	2.1	99.12	12.39	4	3.1
2	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	152.8	1.09	166.552	20.819	4	5.2
3	An,2	F.V Davancial pvc pjesa e tendes jashte	m2	25.8	1.8	46.413	5.801625	2	2.9
4	An,3	Shtrim me pllaka guri trani	m2	240.0	3.12	748.8	93.6	12	7.8
6	An,4	F.V kapak guri trani per kuneten ekzistuese	cope	5.0	2	10	1.25	2	0.6
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 -per kuneten +bordura e betonit	m3	10.0	12.8	128	16	4	4.0
8	An.5	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	63.0	1.5	94.5	11.8125	4	3.0
	3	PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA							
1	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	323.5	0.92	297.62	37.2025	8	4.7
2	2,31O	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	230.0	1.55	356.5	44.5625	8	5.6
		SHUMA 3							
	4	PUNIME DYER DHE DRITARE							
1	2.373/a	F.V Parapet xhamii i temperuar	m2	20.0	1.3	26	3.25	2	1.6
2	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te	m2	1.842	2	3.684	0.4605	2	0.2
3	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar, per ndrysh	m2	5.0	1.3	6.5	0.8125	2	0.4
		SHUMA 4							
	5	PUNIME TARRACE							

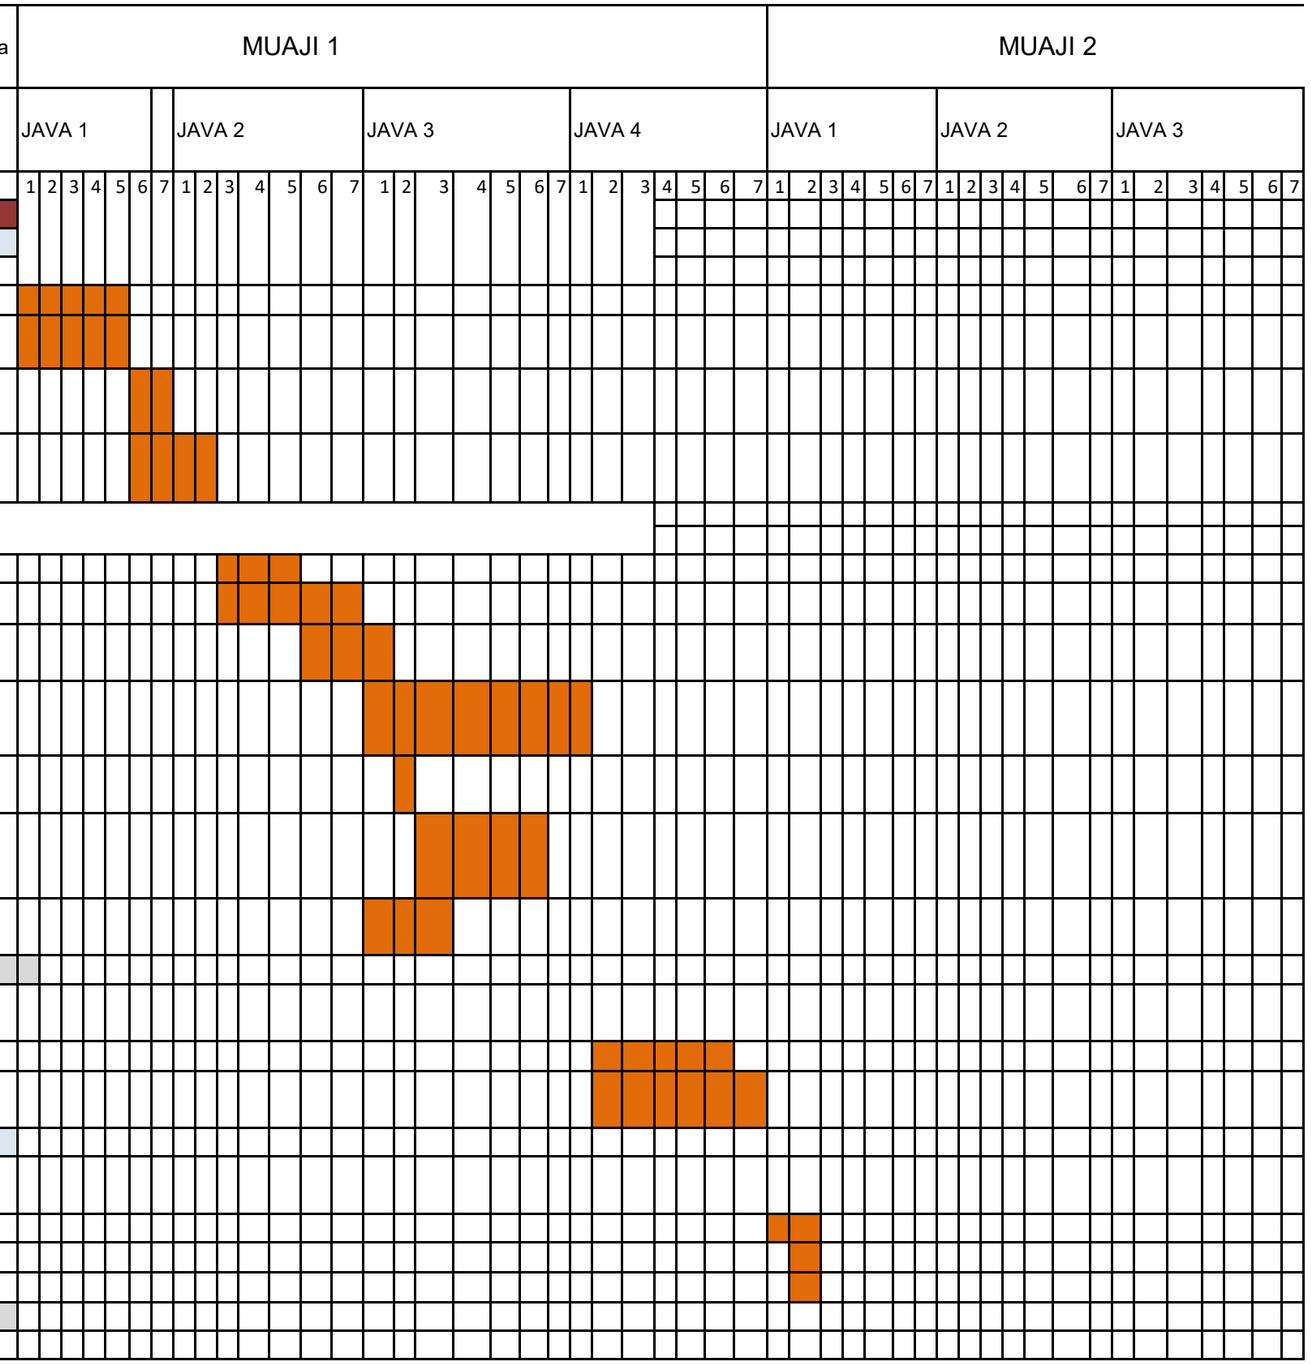
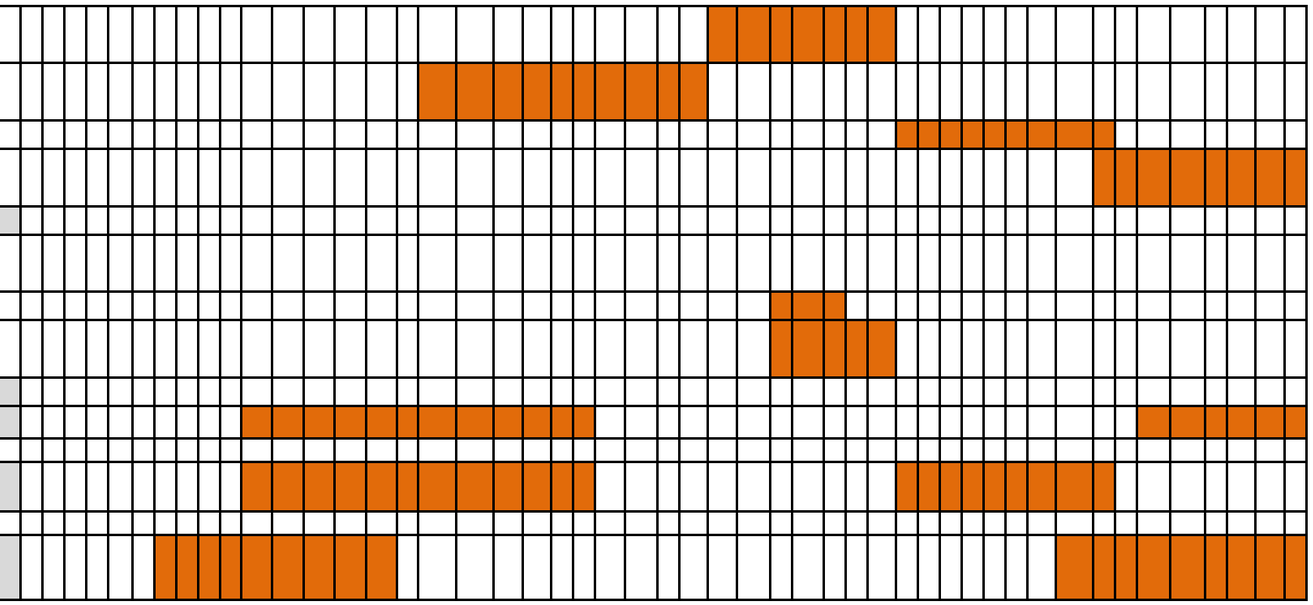
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 per tarracen	m²	630.0	0.66	415.8	51.975	8	6.5
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama per tarracen	m²	630.0	1	630	78.75	8	9.8
3	An.3	Shtrim me pllaka guri trani	m2	229.0	3.12	714.48	89.31	10	8.9
4	2.606	Vendosje pllakash dyshemeje ekzistuese	m2	401.0	1.66	665.66	83.2075	10	8.3
		SHUMA 5							
	6	**P U N I M E B O J A T I S J E**							
1	2.404	Lyerje tavane me boje hidroplastike	m²	220.0	0.36	79.2	9.9	3	3.3
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	400.0	0.36	144	18	4	4.5
	B-	**PUNIME ELEKTRIKE**	OP					5	
	C	**PUNIMET PER SISTEMIN E MNZ**	OP					5	
D		**Sistemi i kondiconimit dhe aspirimit**	OP					5
