MIRATOI
KRYETAR
FLAMUR GOLEMI

GRAFIKU I PUNIMEVE
OBJEKTI: "SISTEMIM-ASFALTIM RRUGA TARONINË-ZHULAT", SEGMENTI I (PROGRESIVA 0 - 2329 m)
NJËSIA ADMINISTRATIVE CEPO
BASHKIA GJIROKASTËR

AFATI I REALIZIMIT TE PUNIMEVE : 16 MUAJ

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI		
1	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	120
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	3600
		2. PUNIME GERMIMI		
3	3.124/1a	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	300
4	3.119/a	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	600
5	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1523
6	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	1523
7	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e zak. me h = 1.5 m	m3	840
		3. PUNIME SHTRESASH		
8	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3358
9	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	13611
10	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	12842
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	12307
12	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2300
13	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	240
		4. ANALIZA TEKNIKE		
14	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	9316
15	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	9316
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
16	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	28
17	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	192
18	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	160
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
19	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	24
20	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	204
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3		
21	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5.36
22	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	11.42
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
23	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	170
24	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	8
25	3.941/4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	6
26	3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	170
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
27	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	7
28	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	698

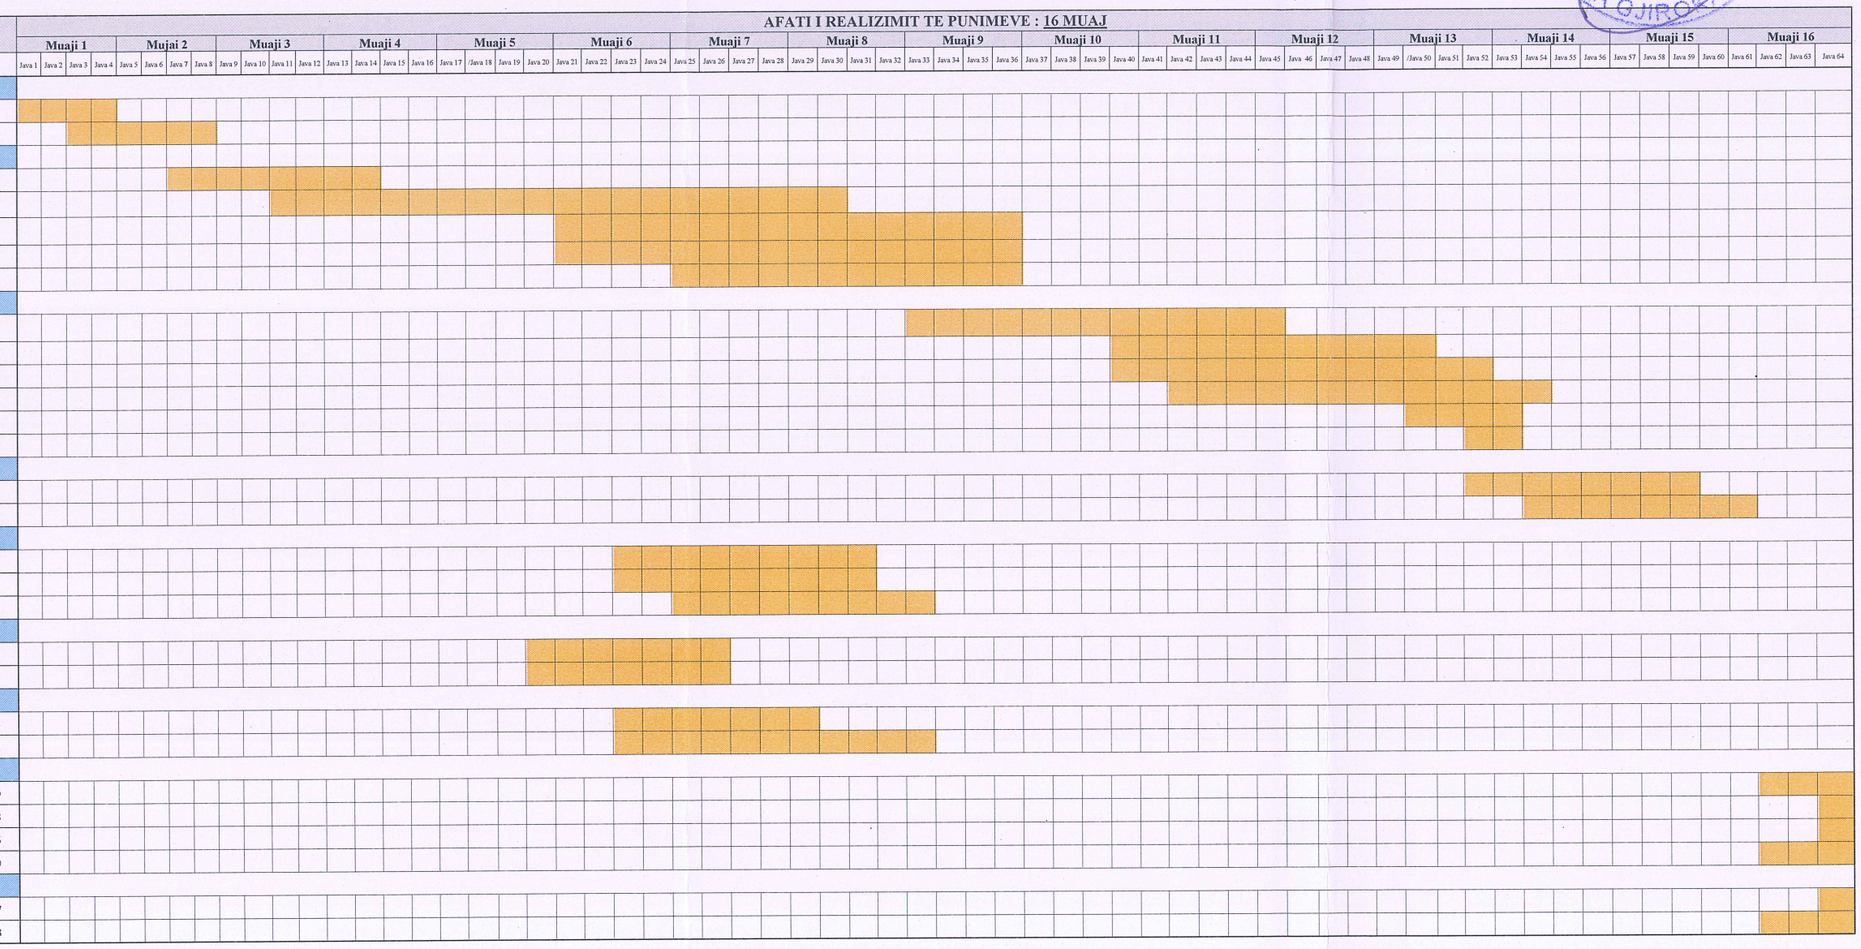

Hartoi: Ing.Aristotel Noni

Ing.Farold Mene
