GRAFIKU I PUNIMEVE

Rikonstruksion fasade te pallateve ne lagjen 1

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ore pune		dite pune	nr i punetoreve	kohezgjatja
					op/nj	sasi		np	dp
1	2.426/9	Prishje suvatim I jashtem	m²	**300**	1.308	392.4	49.05	8	6.1
2	2.306	Suvatim shpatullash ne rikonstruksion	m²	**300**	2.43	729	91.125	9	10.1
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h>4 m	m²	**1,200**	3.5	4200	525	20	26.3
4	2.404/1	Boje hidroplastike, cilesi e larte	m²	**12,700**	0.36	4572	571.5	20	28.6
5	2.431/a	Skele tubo fasade >12m	m²	**12,700**	0.72	9144	1143	30	38.1
6	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m²	**2,265**	2.5	5662.5	707.8125	30	23.6
3	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m²	**540**	2.22	1198.8	149.85	15	10.0

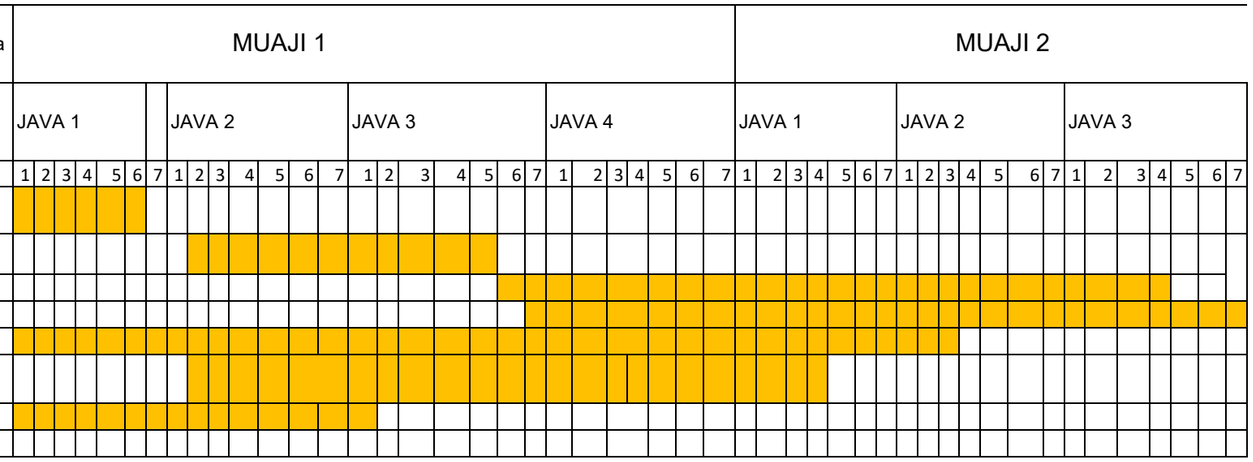

##
